


IPR integravimo veiklų atnaujintas planas 2018-12-13

E.Sveikatos valdybos posėdis



IPR integravimo veiklų planas

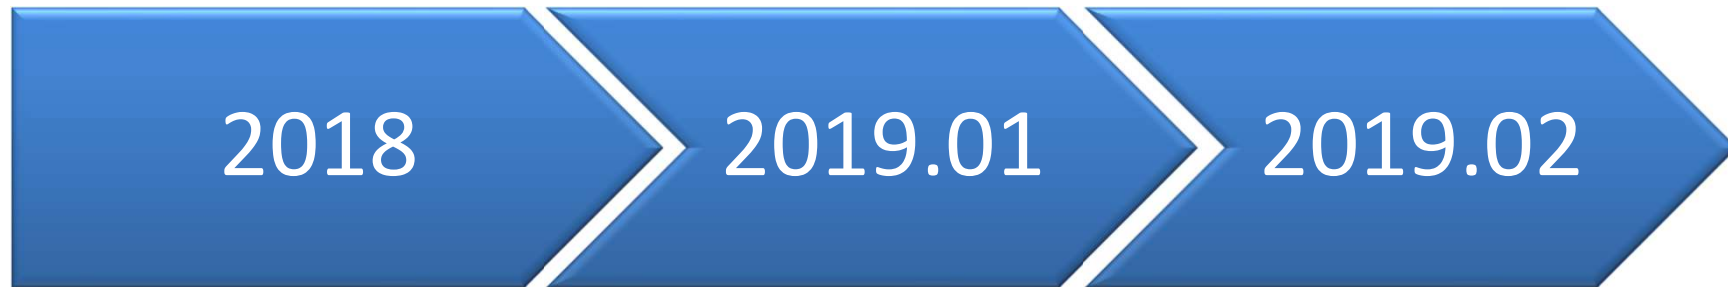

- 2018-08-31
Kūrimo aplinka,
programavimo
darbų pradžia

- 2018-12-21
Techninis projektas -
specifikacija

- 2019-01-02
Paciento portalo
prototipas

- 2019-02-01
Specialisto portalo
prototipas

- 2019-02-15
Žiniatinklio paslaugų
dokumentacijos
pateikimas SPĮ

IPR integravimo veiklų planas

2019.03

2019.04

2019

➤ 2019-03-15 Dokumentacija naudotojams, mokymų pradžia

➤ **2019-03-15 Sudiegimas testinėje aplinkoje**

➤ 2019-03-15 Bandomoji eksploatacija su viena SPĮ

➤ Iki 2019-04-05 Išttestavimas ir klaidų ištaisymas

➤ **2019-04-05 Sudiegimas gamybinėje aplinkoje**

➤ Iki 2019-05-17 Žiniatinklio paslaugų išttestavimas, sudiegimas gamybinėje aplinkoje

➤ Techninis palaikymas, pagalbos tarnyba, registracijos telefonu paslauga, sistemos plėtros darbai

IPR integravimo veiklų planas

Nr.	Veiklos	Datos	Nr.	Veiklos	Datos
1.	IPR, kaip ESPBI IS posistemės, realizacijos techninio projekto parengimas	2018-05-02 – 2018-12-21	9.	IPR sistemos sudiegimas testinėje aplinkoje, skirtoje viešam testavimui	2019-03-15
2.	Kūrimo aplinkų paruošimas, supažindinimas su projektine informacija	2018-06-18 – 2018-08-31	10.	IPR sistemos priimtinum testavimas, iškilusių klaidų taisymas	2019-02-02 – 2019-04-05
3.	Duomenų bazės architektūros parengimas, duomenų struktūrų sukūrimas	2018-09-01 – 2019-01-15	11.	IPR sistemos mokymai naudotojams	2019-03-18 – 2019-12-31
4.	Testavimo aplinkų paruošimas, sistemos architektūros kūrimas, programavimo etapai (taikoma Agile metodologija)	2018-09-01 – 2019-03-15	12.	Eilių valdymo duomenų žiniatinklio paslaugų pateikimas VLK informacinės sistemos integravimo darbams ir iškilusių klaidų taisymas	2019-03-15 – 2019-05-17
5.	IPR Paciento portalo veikiančio prototipo pristatymas	2019-01-02	13.	IPR sistemos žiniatinklio paslaugų pateikimas SPĮ IS integracijoms ir iškilusių klaidų taisymas	2019-03-15 – 2019-05-17
6.	IPR Specialisto portalo veikiančio prototipo pristatymas	2019-02-01	14.	IPR sistemos bandomoji eksploatacija su viena, abipusiai suderinta SPĮ	2019-03-15 – 2019-04-04
7.	Reikiamos dokumentacijos naudotojams ir mokymų medžiagos parengimas	2019-01-02 – 2019-03-15	15.	IPR sistemos sudiegimas gamybinėje aplinkoje	2019-04-05
8.	IPR sistemos žiniatinklio paslaugų dokumentacijos parengimas SPĮ, kad būtų galima ruošti integracijoms	2019-01-02 – 2019-02-15	16.	IPR gamybinė eksploatacija, techninis palaikymas, pagalbos tarnyba, registracijos telefonu paslauga, sistemos plėtros darbai, sutarčių dėl IPR naudojimo sudarymas su SPĮ.	2019-04-05 – 2019-12-31

Dėkojame už dėmesį!
